



UNIVERSITA' degli STUDI ROMA TRE

AREA TECNICA


VIA OSTIENSE N°159 - 00154 ROMA

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI DI SICUREZZA  
E ANTINCENDIO A SERVIZIO DI EDIFICI UNIVERSITARI

**LOTTO 05 - VSN079**

Via della VASCA NAVALE n.79/81 - 00146 - ROMA

LAVORI DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO  
A SERVIZIO DEL COMPLESSO (RILEVAZIONE, EVAC)

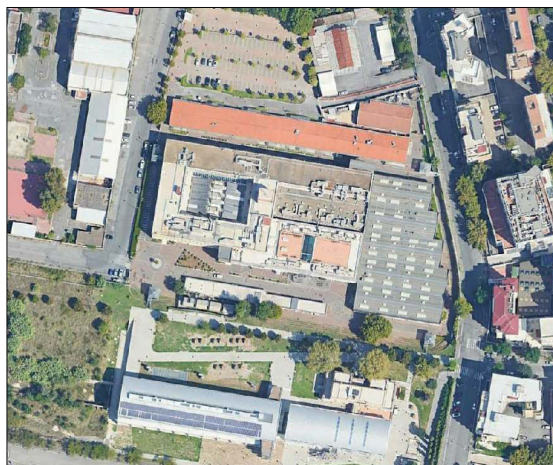

PROGETTISTI

**TECNITALIA ENGINEERING S.r.l.**

Via del Giordano, 30  
00144 Roma (Rm)

Ing. Stefano Di Tullio

N. ELABORATO:

**05.04.02**

NOME FILE:

---

SCALA:

---

DATA:

03 - LUG - 2019

TITOLO ELABORATO:

**CRONOPROGRAMMA**

LOCALIZZAZIONE:

---

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO DA :	VERIFICATO DA :
00	03/07/2019	EMISSIONE		
01	20/09/2019	REVISIONE 01		

EMESSO PER:

☐ COMMENTI

☐ APPROVAZIONE

☐ CANTIERE

☐ COME COSTRUITO (AS BUILT)

**Comune di ROMA**  
Provincia di ROMA

# DIAGRAMMA DI GANTT

## cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** LAVORI DI ADEGUAMENTO CENTRALE ANTINCENDIO LABORATORI EDIFICIO  
"EX OMI" - VIA DELLA VASCA NAVALE, 79/81 - 00146 ROMA  
**COMMITTENTE:** UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA TRE .  
**CANTIERE:** VIA DELLA VASCA NAVALE, 79/81 - ROMA., ROMA (ROMA)

Roma, 20/09/2019

### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(INGEGNERE DI TULLIO STEFANO)

*per presa visione*

### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(RETTORE PIETROMARCHI LUCA)

### INGEGNERE DI TULLIO STEFANO

VIA DEL GIORDANO, 30  
00144 ROMA (ROMA)  
Tel.: 065401806 - Fax: 065412626  
E-Mail: stefanoditullio@tecnitalia.net

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
<b>Preparazione delle aree di cantiere</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	4	6	22/03/2018	27/03/2018
<b>Apprestamenti del cantiere</b>						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	4	6	22/03/2018	27/03/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	4	6	22/03/2018	27/03/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	4	6	22/03/2018	27/03/2018
Montaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	2	2	27/03/2018	28/03/2018
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	1	1	11/06/2018	11/06/2018
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>						
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	5	5	26/03/2018	30/03/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	5	5	26/03/2018	30/03/2018
<b>Smobilizzo del cantiere</b>						
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	6	13/06/2018	18/06/2018
<b>IMPIANTI TRADIZIONALI</b>						
<b>Assistenze murarie</b>						
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici	1	E	16	22	03/04/2018	24/04/2018
Esecuzione di tracce eseguite a mano	1	E	16	23	05/04/2018	27/04/2018
<b>Impianti antincendio</b>						
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	E	16	23	30/04/2018	22/05/2018
Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza	1	E	29	40	30/04/2018	08/06/2018
<p><b>LEGENDA:</b></p> <p>Z = ZONA</p> <p>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>I = IMPRESA</p> <p>Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:</p> <p>E &lt;Nessuna impresa definita&gt;</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>						

[illegible]
